

Software Test Report

דו"ח סיכום בדיקות

RDC	שם הפרויקט
RetailDiscountCalculator Version 1.0.0.0 RetailDiscountCalculator Version 1.0.1.0	שם המוצר וגרסה
Ofek Katz Team member	מחבר הדו"ח
26/04/26	תאריך הגשה

1. תקציר מנהלים / Executive Summary


דוח זה מתייחס לשתי הגרסאות האחרונות של מערכת RDC 1.0.0.0 + 1.0.1.0 במהלך הבדיקות הורצו 181 מקרי בדיקה ו-48% עברו בהצלחה. נמצאו 82 תקלות מתוכן 71 קריטיות.

הושג כיסוי בדיקות מלא וכיסוי דרישות, אולם לא עמדנו בקריטריוני היציאה בהיבט כמות התקלות הפתוחות (כולל קריטיות High ו-Critical) ואחוז מקרי הרצה אשר עברו בהצלחה.

נכון למצב הנוכחי, הגרסה אינה עומדת במלואה בקריטריוני היציאה ומוגדרת כ-No-Go לשחרור. נדרש טיפול בתקלות הקריטיות והשלמת סבב בדיקות נוסף לאחר תיקון גרסה. לאחר מכן תתבצע הערכה חוזרת בהתאם לקריטריוני היציאה שהוגדרו.

TEST COVERAGE REPORT:

PASSED:




Requirements with Status "New" and Status "OK"

View Issues

Search

Key	Summary	Total Tests	Passed	Failed	Other	Completeness
TLV66-357	חישוב סה"כ קנייה למחלקה לפני הנחה 2.2	12	12	0	0	100%

BLOCKED:




Requirements with Status "New" and Status "NOTRUN"

View Issues

Search

FAILED:




Requirements with None "None" and Status "NOK"

View Issues

Search

Key	Summary	Total Tests	Passed	Failed	Other	Completeness
TLV66-190	OK 1.5 הגדרת כמות ומחיר רכישה	12	3	6	3	25%
TLV66-189	OK 1.4 הגדרת אחוז הנחה מיוחדת	15	9	4	2	60%
TLV66-188	OK 1.3 הגדרת הנחת חבר	10	3	5	2	30%
TLV66-187	OK 1.2 הגדרת הנחות לפי כמות פריטים	44	28	10	6	63.6%
TLV66-186	OK 1.1 הגדרת הנחות לפריטים מקודמים למחלקה	25	15	9	1	60%





Requirements with Status "New" and Status "NOK"

View Issues

Search

Key	Summary	Total Tests	Passed	Failed	Other	Completeness
TLV66-364	2.9 ...נחה כלשהי כאשר הסכום + כמות לא תקינים	18	0	7	11	0%
TLV66-362	2.7 חישוב הנחה מיוחדת	3	2	1	0	66.6%
TLV66-361	2.6 ...חות מצטברות (של מקודמים, לפי כמות וחבר)	4	0	2	2	0%
TLV66-360	2.5 חישוב הנחת חבר	2	1	1	0	50%
TLV66-359	2.4 חישוב הנחה לפי כמות	9	2	3	4	22.2%
TLV66-358	2.3 חישוב הנחה לפריטים מקודמים	7	1	1	5	14.2%
TLV66-320	2.1 חישוב מחיר לפריט מקודם לפני הנחה	21	9	2	10	42.8%

TEST LIST REPORT BY STATUS		
Status		
Blocked	44	
FAILED	51	
PASSED	86	
Grand Total	181	

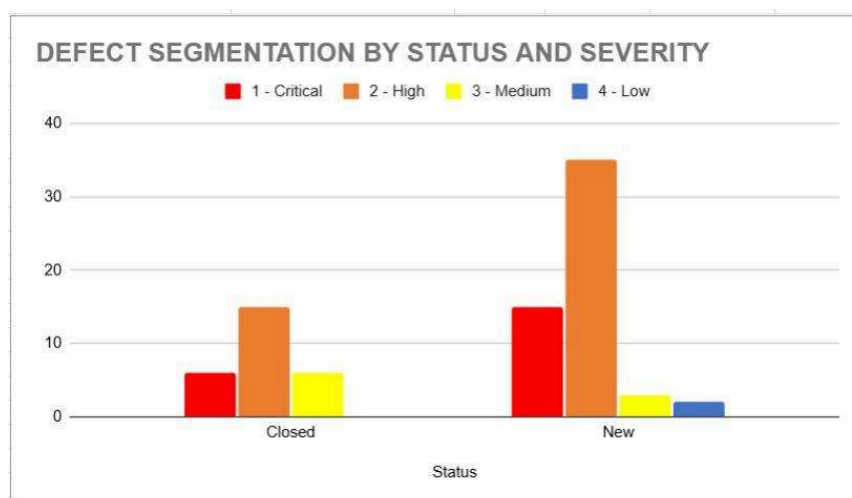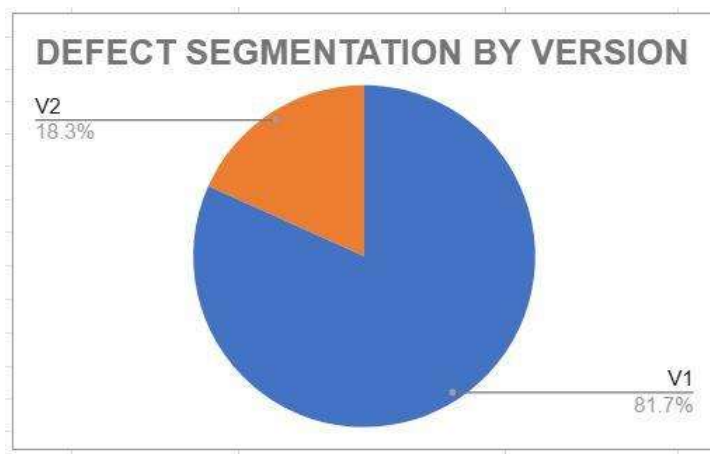

2. ממצאים / Findings

לוחות זמנים

סיבה	סטייה בימים	תאריך סיום בפועל	תאריך התחלה בפועל	תאריך סיום מתוכנן	תאריך התחלה מתוכנן	פעילות
-	-	12.03.26	10.03.26	12.03.26	10.03.26	ניתוח דרישות
-	-	19.03.26	15.03.26	19.03.26	15.03.26	עיצוב בדיקות
-	-	26.03.26	22.03.26	26.03.26	22.03.26	יישום בדיקות
-	-	02.04.26	29.03.26	02.04.26	29.03.26	סבב בדיקות 1
-	-	09.04.26	05.04.26	09.04.26	05.04.26	סבב בדיקות 2
-	-	23.04.26	12.04.26	23.04.26	12.04.26	סיכום בדיקות / STR

משאבים (כוח אדם)

משאב	מתוכנן	בפועל	סטייה	סיבה
מנהל בדיקות	1	1	-	-
בודקים	2	2	-	-
תשתיות	-	-	-	לא היה צורך בהתאם להקשר הפרויקט והיקפו
אוטומציה	-	-	-	לא היה צורך בהתאם להקשר הפרויקט והיקפו

כיסוי דרישות

מאפיין Feature	סה"כ בדיקות	הורצו	עברו בהצלחה	נכשלו	חסום	% עבר מתוך הרצה	% עבר מסה"כ
הגדרת הנחות	102	102	58	34	10	57%	57%
חישוב הנחות	79	79	28	17	34	35%	35%
סה"כ	181	181	86	51	44	48%	48%

תקלות

המערכת מכילה מספר ניכר של תקלות פתוחות גם לאחר שחרור גרסה 1.0.1.0, עם ריכוז גבוה בתקלות פונקציונליות

מאפיין Feature	סה"כ תקלות	סה"כ פתוחות	סה"כ סגורות	סה"כ בוטלו	קריטיות פתוחות	קריטיות שתוקנו	% קריטיות פתוחות
הגדרת הנחות	42	28	14	0	25	13	60%
חישוב הנחות	40	27	13	0	25	8	63%
סה"כ	82	55	27	0	50	21	61%

3. הערכת איכות / Quality Assessment

על פי ניתוח קריטריוני היציאה, ניכר כי המערכת עומדת באופן חלקי בדרישות שהוגדרו הושגו קריטריונים הקשורים לכיסוי דרישות והרצת מקרי בדיקה, אולם קיימת חריגה משמעותית בשיעור מקרי הבדיקה שעברו בהצלחה וכן במספר התקלות הקריטיות הפתוחות מצב זה מצביע על כך שהמערכת אינה בשלה לשחרור ודורשת טיפול בתקלות הקריטיות טרם מעבר לשלב הבא

קריטריון יציאה	יעד	תוצאה בפועל	הערות
% דרישות שכוסו ע"י מקרי בדיקה	95%	95%	הושג במלואו, נבדקו כל הדרישות שהוגדרו ללא פערים
% מקרי בדיקה שהורצו	100%	100%	הושג במלואו, הורצו כל מקרי הבדיקה שהוגדרו ללא פערים
% מקרי בדיקה שהורצו ועברו בהצלחה	70%	48%	לא הושג, שיעור מעבר מקרי הבדיקה נמוך מהיעד שנקבע במסגרת הקריטריון (70%)
מספר תקלות קריטיות פתוחות	0	50	לא הושג עקב הימצאות תקלות קריטיות פתוחות, נדרש טיפול לפני שחרור

מספר תקלות לא קריטיות פתוחות	15	5	הושג במלואו, מספר התקלות הפתוחות שאינן קריטיות עומד במסגרת הקריטריון (עד 15)
------------------------------	----	---	--

4. סטטוס סיכונים לאור ממצאי הבדיקות / Risk Status Post-Testing

מספר	סיכון	הסתברות	השפעה	רמת סיכון	טיפול
1	חוסר תקשורת עם צוות הפיתוח	95%	90	85.5	להוסיף כמשאב נציג מצוות הפיתוח שיתוודך בפגישות מעקב ויעדכן את צוות הפיתוח
2	שגיאות חישוב לא מזוהות- סיכון לפערי מחיר בין הקופה למוכרן, תלונות לקוחות ופגיעה במוניטין העסק	80%	100	80	על צוות הפיתוח לתקן את הבאגים שנמצאו בסבבי הבדיקות ולמצוא את הפגמים בקוד הגורמים את שגיאות החישוב. התוכנה לא תשוחרר לפני שהסתברות הסיכון תקטן באופן משמעותי.
3	היעדר בדיקות מהימנות- סיכון לבעיות יציבות	95%	80	76	הסיכון לא התממש במהלך הבדיקות, אך עשוי להתממש בסביבת ייצור. מומלץ שלא לשחרר את המערכת בשלב זה עד לבחינה וטיפול נוסף בסיכון
4	לא הוגדרה דרישת סנכרון לעדכוני הנחות בין מכשירים- סיכון לשימוש בנתונים לא מעודכנים ולטעויות חישוב	60%	90	54	כתוכנית מגירה, התייעצות עם הלקוח והמעורבים בפרויקט לגבי מימוש הסנכרון בדרישה.
5	היעדר בדיקות ממשק גרפי- סיכון לתקלות שלא יזוהו	90%	50	45	הסיכון לא התממש במהלך הבדיקות, אך עשוי להתממש בסביבת ייצור. מומלץ להיערך באמצעות ניטור/ בדיקות נוספות לאחר השחרור
6	לחץ של זמן- סיכון לכיסוי בדיקות חלקי	30%	90	27	הפקת לקחים מעמידה בל"ז באיטרציה הנוכחית ויישום בסבבים הבאים
7	הוספת סוגי הנחה חדשים מחייבת שחרור גרסה ואינה נתמכת באופן דינמי	50%	50	25	ישאר כסיכון, תשוחרר גרסה חדשה בהתאם לצורך
8	היעדר בדיקות תאימות(טאבלטים)- סיכון לתקלות תצוגה ותפקוד שלא יזוהו	20%	80	16	הסיכון לא התממש במהלך הבדיקות, אך עשוי להתממש בסביבת ייצור. מומלץ להיערך באמצעות ניטור/ בדיקות נוספות לאחר השחרור
9	דרישות עמומות במסמכי אפיון- סיכון לפרשנות שגויה	15%	90	13.5	דרישות נוכחיות הובנו על אף שאופיינו בחוסר בהירות, הבהרה ללקוח להציג דרישות חדשות במקרה הצורך באופן מובהר וברור

10	חוסר נסיון עם סביבת העבודה והכלים- סיכון לכיסוי בדיקות חלקי ושגיאות בתיעוד	5%	95	4.75	הבודקים התנסו עם סביבת העבודה והכלים באופן אפקטיבי והתמקצעו בהם כך שהסיכון פחת משמעותית. במקרה שבודקים חדשים מתווספים לצוות, יישום של סדנאות/הדרכות בהתאם.
----	--	----	----	------	---

5. מסקנות והמלצות לסבב הבא / Conclusions and Recommendations for Next Cycle

- נמצאה כמות גבוהה של תקלות פונקציונליות, במיוחד סביב חישובי מערכת ותנאי קלט. מומלץ לחזק את שלב בדיקות היחידה (Unit Tests) במטרה לצמצם תקלות בסיסיות טרם הגעה לבדיקות מערכת
- במהלך העבודה נמצאו חוסר בהירות במסמכי האפיון, כולל חוסר אחידות ולעיתים סתירות בין דרישות שונות. ממצא זה הדגיש את החשיבות של אפיון מדויק, עקבי ומפורט, על מנת לצמצם פערי הבנה ולשפר את איכות הבדיקות ואת התאמת המוצר לדרישות.
- ניכר כי היעדר תקשורת ישירה וזמינה עם צוות הפיתוח הקשה על הבהרת דרישות וסוגיות שעלו במהלך הבדיקות, ולעיתים יצר צורך בהנחות בפרשנות הדרישות. מצב זה הדגיש את החשיבות של ערוצי תקשורת זמינים וברורים בין צוותי הבדיקות והפיתוח לשיפור דיוק העבודה ויעילות הטיפול בתקלות.
- מומלץ להגדיר איש קשר קבוע מצוות הפיתוח אשר יהיה זמין לתקשורת שוטפת, במטרה לאפשר בירור מהיר של סוגיות ושיפור תהליך הטיפול בתקלות.
- ניכר כי ממשק המשתמש וה-UX של המערכת אינם מודרניים עשויים להשפיע על חוויית המשתמש. ייתכן ויש מקום לשדרוג עיצובי ושיפור חוויית שימוש בסבב עתידי.
- למרות הלחץ, צוות הבדיקות הראה מסוגלות בעמידה בל"ז ולכן מוערך שיהיה מסוגל לעמוד בל"ז דומה בסבבים הבאים.
- בסבב האחרון, בשל היקף מקרי הבדיקה המצומצם, בוצעה רגרסיה מלאה. בסבבים הבאים בהתאם להיקף, מומלץ לבצע ניתוח השפעה כדי לבחור מקרי בדיקה בצורה סיכונית.
- לאור הסיכון הגבוה, מומלץ לשקול לבצע סוגי בדיקות שלא נבדקו בסבב הנוכחי בסבב הבדיקות הבא, בדגש על בדיקות מהימנות.
